別添１ 調査場所

下関市勤労青少年ホーム　（下関市彦島老の山公園１－１）

No	場所	検体数	詳細場所	建材	別添２図面上場所
1	地下　機械室	1	床	モルタル	①
2	地下　機械室	1	壁	ボード	①
3	地下　機械室	1	壁	岩綿吹付（下地調整材共）	①
4	地下　機械室	1	ガス配管	ガスケット	①
5	地下　機械室	1	チーリングユニット	配管保温材	①
6	地下　機械室	1	チーリングユニット	フランジ部	①
7	地下　機械室	1	温水配管	フランジ部	①
8	地下　機械室	1	温水配管	配管保温材	①
9	地下　機械室	1	ボイラー設備（煙道）	フランジ部	①
10	地下　機械室	1	階段室（壁）	モルタル	①
11	１階	1	玄関　床	タイル（下地調整材共）	②
12	１階	1	玄関　天井	岩綿吸音板	②
13	１階	1	階段室（１階～２階）	ソフト巾木	③
14	１階	1	階段踏み面（１階～２階）	長尺シート	③
15	１階	1	階段室　上裏（１階～２階）	吹付材	③
16	１階	1	ホール　壁	ソフト巾木	④
17	１階	1	ホール　壁	塗材	④
18	１階	1	ホール　床	クッションフロア	④
19	１階	1	娯楽談話室　壁	巾木	⑤

20	1階	1	娯楽談話室　壁	クロス	⑤
21	1階	1	娯楽談話室　天井	クロス（下地ボード共）	⑤
22	1階	1	娯楽談話室　床	長尺シート	⑤
23	1階	1	娯楽談話室　空調ダクト	配管保温材	⑤
24	1階	1	喫茶コーナー	巾木	⑥
25	1階	1	事務室　床	Pタイル（下地調整材共）	⑦
26	1階	1	事務室　壁	ソフト巾木	⑦
27	1階	1	事務室　壁	塗材（下地モルタル共）	⑦
28	1階	1	事務室　天井	ボード	⑦
29	1階	1	事務室内　トイレ床	タイル（下地調整材共）	⑦
30	1階	1	事務室内　トイレ壁	タイル（下地調整材共）	⑦
31	1階	1	事務室内　トイレ天井	石綿板	⑦
32	1階	1	便所（男女共）床	タイル（下地調整材共）	⑧
33	1階	1	便所（男女共）壁	タイル（下地調整材共）	⑧
34	1階	1	便所（男女共）壁	塗材（下地調整材共）	⑧
35	1階	1	便所（女子）壁	塗材（下地調整材共）	⑧
36	1階	1	宿直室　壁	塗材（下地調整材共）	⑨
37	1階	1	軽運動室　床	フローリング（接着剤）	⑩
38	1階	1	軽運動室　壁	塗材（下地調整材共）	⑩
39	1階	1	軽運動室　天井	岩綿吸音板	⑩
40	1階	1	器具庫　床	モルタル	⑪
41	1階	1	更衣室　床	Pタイル（下地調整材共）	⑫

42	１階	1	更衣室　床	タイル（下地調整材共）	⑫
43	１階	1	更衣室　壁	タイル（下地調整材共）	⑫
44	１階	1	廊下　壁	ソフト巾木	⑬
45	１階	1	廊下　壁	塗材（下地モルタル共）	⑬
46	２階	1	ホール　天井	岩綿吸音板	⑭
47	２階	1	ホール　床	長尺シート	⑭
48	２階	1	集会室　床	Pタイル	⑮
49	２階	1	集会室　壁	巾木	⑮
50	２階	1	集会室　壁	クロス	⑮
51	２階	1	集会室　天井	ボード	⑮
52	２階	1	音楽室　壁	クロス	⑯
53	２階	1	音楽室　天井	ボード	⑯
54	２階	1	音楽室　床	長尺シート	⑯
55	２階	1	倉庫　床	Pタイル	⑰
56	２階	1	倉庫　壁	ソフト巾木	⑰
57	２階	1	倉庫　壁	塗材（下地モルタル共）	⑰
58	２階	1	倉庫　天井	ボード	⑰
59	２階	1	便所（男女共）床	タイル	⑱
60	２階	1	便所（男女共）壁	タイル	⑱
61	２階	1	便所（男女共）天井	石綿版	⑱
62	２階	1	便所（男女共）壁	塗材	⑱
63	２階	1	便所（男子）PS	配管保温材	⑱

64	３階	1	第２集会室　床	Pタイル	⑲
65	３階	1	第２集会室　壁	ソフト巾木	⑲
66	３階	1	第２集会室　壁	塗材（下地モルタル共）	⑲
67	３階	1	第２集会室　天井	ボード	⑲
68	３階	1	料理教室　床	タイル（下地調整材共）	⑳
69	３階	1	料理教室　腰壁	タイル（下地調整材共）	⑳
70	３階	1	料理教室　壁	塗材（下地モルタル共）	⑳
71	３階	1	料理教室　天井	ジプトーン	⑳
72	３階	1	和室　壁	聚楽	㉑
73	３階	1	和室（床の間）壁	聚楽	㉑
74	３階	1	和室（給湯室）コンロ廻り	ケイカル板	㉑
75	３階	1	楽器倉庫　床	長尺シート	㉒
76	３階	1	楽器倉庫　壁	吹付塗材（下地調整材共）	㉒
77	３階	1	楽器倉庫　壁	タイル（下地調整材共）	㉒
78	３階	1	楽器倉庫　ダクト	フランジ部	㉒
79	３階	1	楽器倉庫　排煙ダクト	保温材	㉒
80	３階	1	楽器倉庫　折板屋根裏	断熱材	㉒
81	屋上	1	床	塗膜防水（下地調整材共）	㉓
82	屋上	1	軒天	吹付塗材（下地調整材共）	㉓
83	屋上	1	パラペット	吹付塗材（下地調整材共）	㉓
84	屋上	1	梁	吹付塗材（下地調整材共）	㉓
85	屋上	1	煙突内部	断熱材	㉓

86	屋上	1	高架水槽	配管保温材	㉓
87	屋上	1	冷却塔	配管保温材	㉓
88	外部	1	外壁（地下～１階部）	吹付塗材（下地調整材共）	㉔
89	外部	1	外壁（２階部～３階部）	吹付塗材（下地調整材共）	㉔
90	外部	1	玄関　土間	タイル（下地調整材共）	㉕
91	外部	1	サッシ廻り	シーリング	㉖
92	外部	1	竪樋（軽運動室付近）	タイル（下地調整材共）	㉗
93	外部	1	外壁（玄関付近）	タイル（丸形）（下地調整材共）	㉘
94	外部	1	軒天（玄関上部）	ケイカル板	㉙

計　94

別添２図面

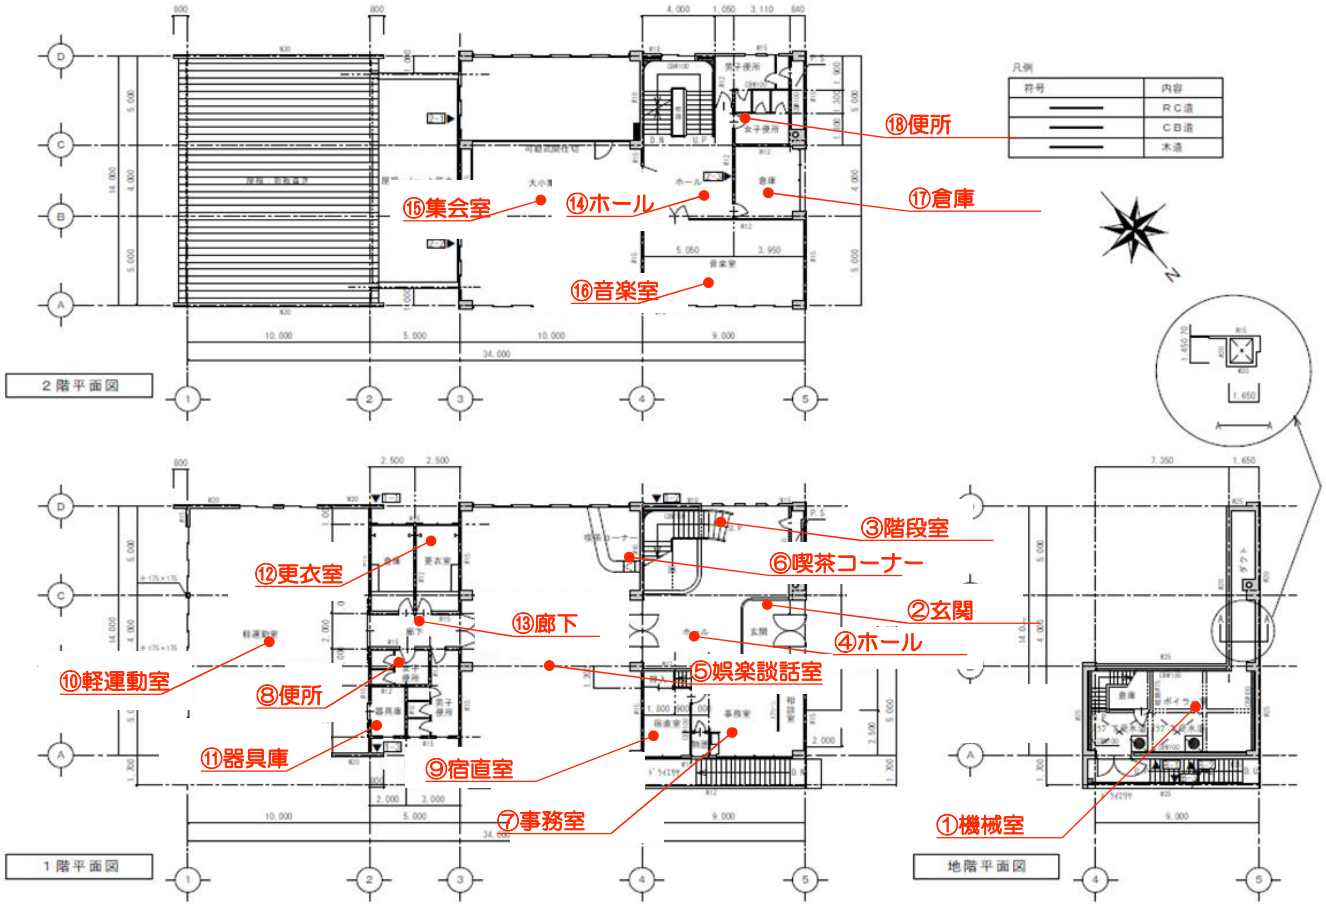
⑱便所
⑰倉庫
⑮集会室
⑭ホール
⑯音楽室
２階平面図
③階段室
⑥喫茶コーナー
⑫更衣室
②玄関
⑬廊下
④ホール
⑩軽運動室
⑤娯楽談話室
⑧便所
⑪器具庫
⑨宿直室
⑦事務室
１階平面図
①機械室
地階平面図

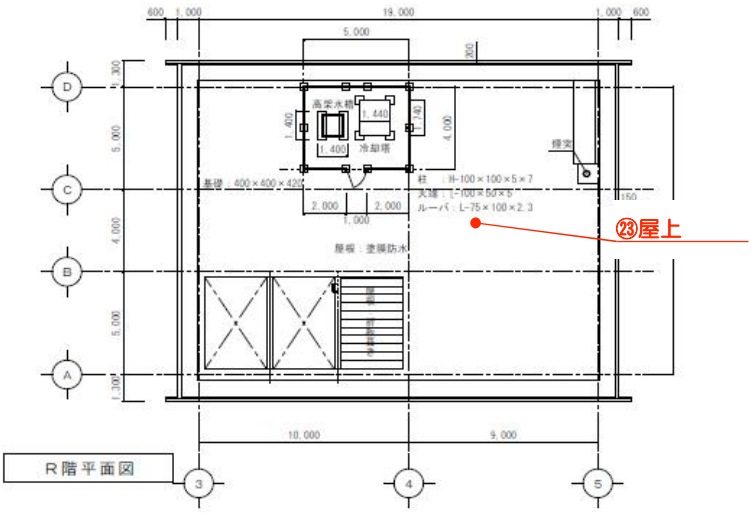
㉓屋上
R階平面図

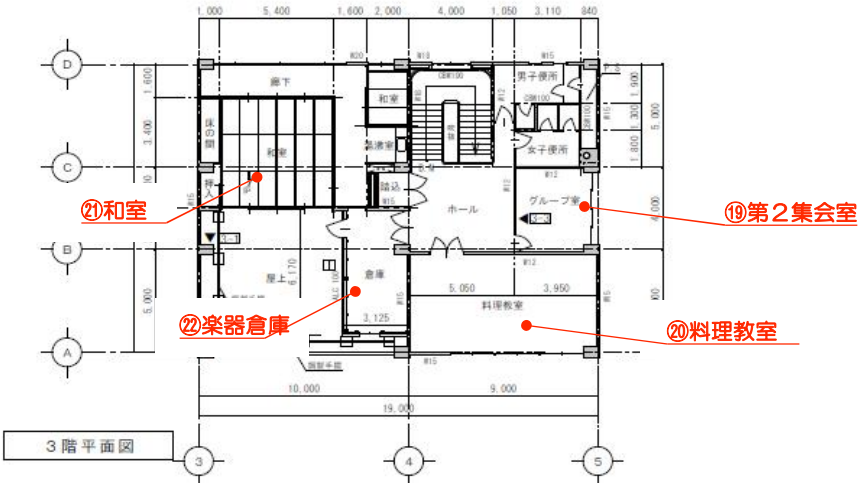
㉑和室
㉒楽器倉庫
⑲第２集会室
⑳料理教室
3階平面図


㉗竪樋（タイル）
西立面図

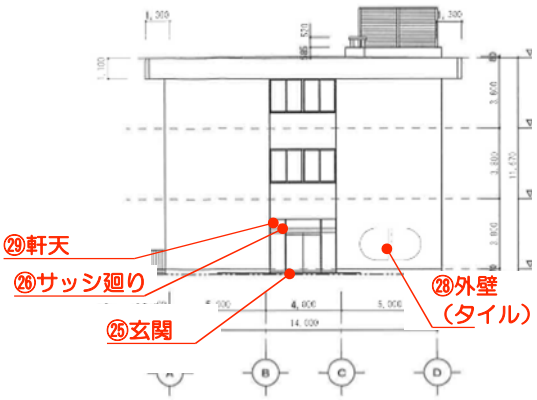
㉙軒天
㉖サッシ廻り
㉕玄関
㉘外壁
（タイル）
北立面図

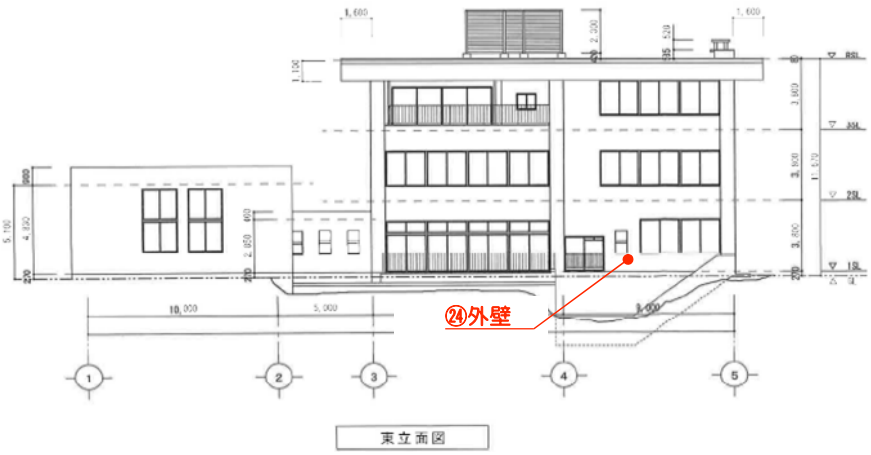
㉔外壁
東立面図

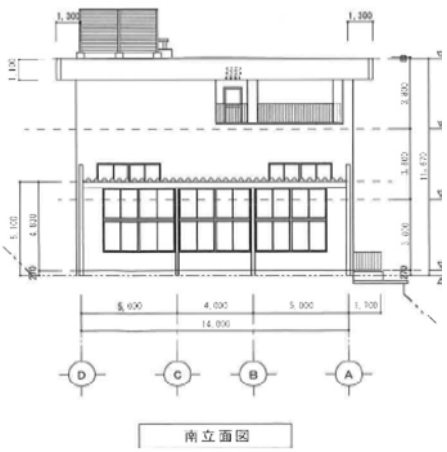
南立面図
